

Stand Projektierung Windpark Twerberg

Stadtwerke Beverungen
Stadtwerke Steinheim
Stadtwerke Bad Driburg



Stadtwerke Warburg
Gas- und Wasserversorgung Höxter
Stadtwerke Borgentreich
Stadt Brakel

Projektentwicklungsgesellschaft Windenergie Kreis Höxter mbH
Genossenschaftsversammlung der Energie für den Kreis Höxter eG

Gliederung

1. Aktueller Stand der Projektentwicklung
2. Nächste Schritte
3. Gründung der Betreibergesellschaft

1. Aktueller Stand der Projektentwicklung

- Abstimmung bei der Umsetzung mit der Stadt Beverungen und dem Kreis Höxter

B- und F-Plan (Scoping-Termin hat am 24.01.2014 im Rathaus Beverungen stattgefunden)

BImSch-Verfahren (Vorbesprechung zum Antragsverfahren hat am 11.03.2014 im Kreishaus stattgefunden)
(Antragsverfahren wird gestartet, sobald die Entscheidung über den Anlagentyp gefallen ist und die Infrastrukturgesellschaft gegründet ist)

- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Vögel und Fledermäuse) liegt vor.

1. Aktueller Stand der Projektentwicklung

- Vorprüfung von Schall und Schattenwurf (Gutachten wird gerade durch die Firma Enveco erstellt, erste Ergebnisse liegen vor)
- Zusage für Vorhaben von Bundeswehr (Radaranlage Auenhausen)
- Netzanschluss geklärt – Einspeisung in das Netz der BeSte Stadtwerke GmbH, zur Zeit findet die Planung der Verkabelung durch die Firma SAG statt
- Zuwegung für die Erschließung des Windparks wird durch das Ing. Büro Turk geplant
- Verhandlungen über die Vergabe zur Herstellung und Aufstellung der Windkraftanlagen sind kurz vor dem Abschluss

1. Aktueller Stand der Projektentwicklung

- Grundstücksverhandlungen werden durchgeführt, die endgültigen Verträge liegen den Eigentümern vor. Von den sieben Anlagen sind fünf Anlagen durch Verträge gesichert; die Grundstücke für die letzten beiden Anlagen werden voraussichtlich in einem Abstimmungsgespräch in der nächsten Woche gesichert
- Gründung der Betreibergesellschaft in Vorbereitung
 - Erste Beschlüsse der Räte Beverungen, Bad Driburg und Steinheim liegen vor. Der Rat der Stadt Warburg und der Stadt Höxter wird in seiner nächsten über die Beteiligung beraten und möglicherweise beschließen
- Abstimmung der Gesellschaftsverträge mit der Kommunalaufsicht wird gerade durchgeführt.

2. Nächste Schritte

- Voraussetzung für den nachfolgenden Zeitplan und damit Erreichung eines wirtschaftlichen Windparkbetriebes ist die Gründung der Betreibergesellschaft Anfang des 3. Quartals 2014
- Mai – Juli 2014 Gründung der Betreibergesellschaft, Veräußerung des Projektes durch die Projektentwicklungsgesellschaft an die Betreibergesellschaft
- August – Okt. 2014 Nach Gründung der Betreibergesellschaft Auftragsvergaben für die Herstellung und Aufbau der Windenergieanlagen, Verkabelung des Windparks, Herstellung der Zuwegung
- Sep. – Nov. 2014 Abschluss Genehmigung B- und F-Plan sowie BImSchG

2. Nächste Schritte

- Okt. – Dez. 2014 Baubeginn
- Okt. – Nov. 2015 Inbetriebnahme des Windparks


3. Gründung der Betreibergesellschaft

- Gründung der Betreibergesellschaft durch die Stadtwerke Beverungen, Stadtwerke Bad Driburg GmbH, Stadtwerke Steinheim GmbH, Stadtwerke Warburg GmbH und GW Höxter GmbH als Gründungsgesellschafter

- Weitere mögliche Partner beim Windpark Twerberg
 - Stadtwerke Borgentreich
 - Stadt Brakel
 - Trianel Onshore GmbH & Co. KG
 - Energiegenossenschaft Kreis Höxter eG

3. Gründung der Betreibergesellschaft

➤ Gesellschaftsstruktur

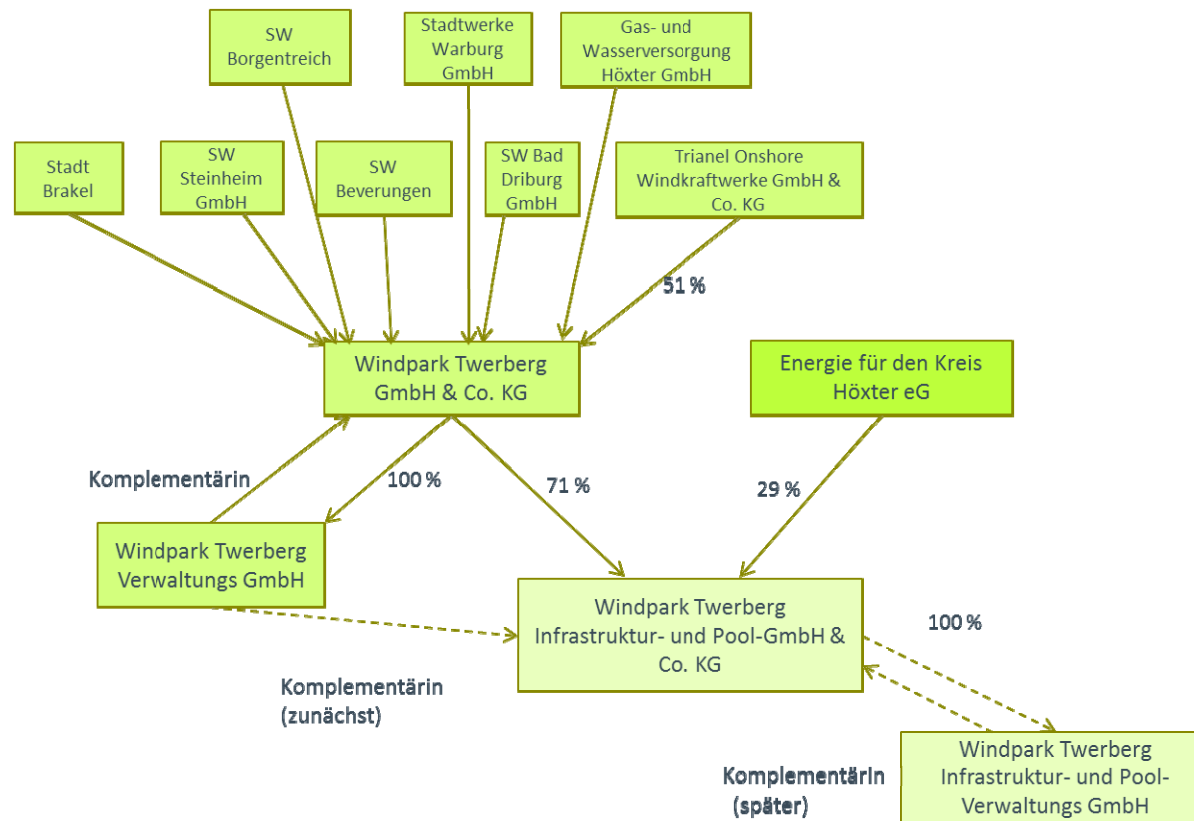

3. Gründung der Betreibergesellschaft

➤ Risikobetrachtung

- Das mit der Gründung der Gesellschaften verbundene Risiko der Gründungsgesellschafter ist zunächst auf die geleisteten Einlagen (Euro 25.000 Stammeinlage und Euro 100 Kommanditeinlage) begrenzt.
- Erst mit einer Entscheidung zur Projektrealisierung ausschließlich unter der Bedingung, dass eine Mindestrendite von 7 % p.a. erwartet werden kann, beabsichtigen die Gesellschafter eine Erhöhung ihrer Kapitaleinlagen mit der Konsequenz einer entsprechenden Risikoerhöhung auf die dann zugesagte Einlage.
